Asaru prospekts
60.0
Dzimtenes iela
Urb.79*
OD315, PP
729
Rūsiņa iela
Kāpu iela
Dzimtenes iela
Vārpu iela
Selgas iela
Andreja iela
min. 3.0m
min. 3.5m
OD250, PP
OD110, PE
Valtera prospekts
Marijas iela
Melužu prospekts
Priežu iela
Pumpuru iela
OD225, PE
K1
U1
URB-13
STOP
100m
x=313000
y=481400
x=313000
y=481650
118
123
108
109
206
207
302
319
534
541
608
609
730
731
732
733
801
810
811
528A
529A

LATTELECOM KABELI ATRAKT, IEVIETOT AIZSARGČAULĀ d110mm, UN UZ IZBŪVES LAIKU NOSTIPRINĀT - IEKĀROT. POSMA GARUMS ~7.0m

DARBA VIETAS APRĪKOŠANAS AR BARJERĀM

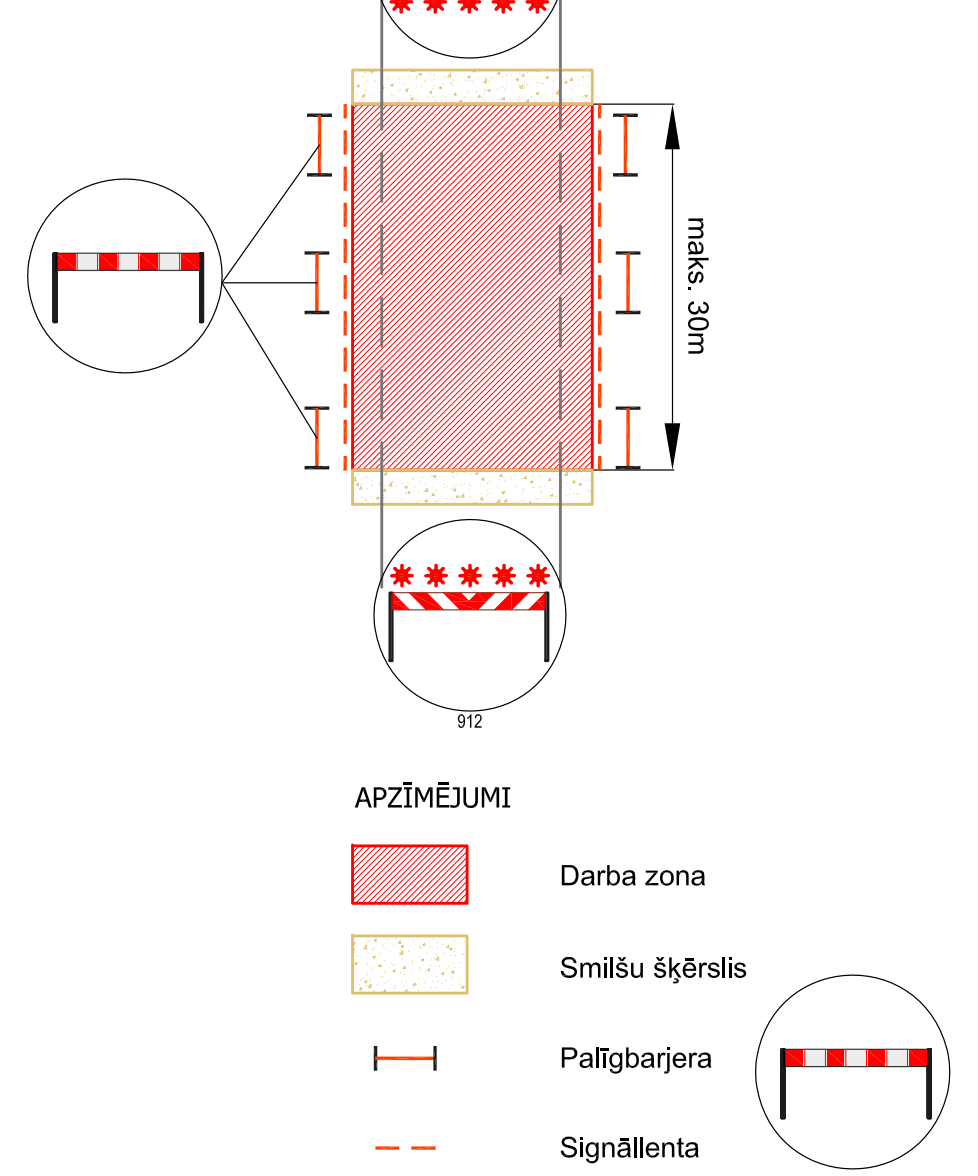
912
maks. 30m
912
APZĪMĒJUMI
Darba zona
Smilšu šķērslis
Palīgbarjera
Signālenta
Barjera Nr. 912
912

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI

Ceļa zīmes balsta uzstādīšanas vieta

Ceļa zīme un to Nr.

Darba zona

Garennorobežojums: divpusīgie vadstatņi Nr. 908/909; maksimāli 5m attālumā cits no cita. Divpusīgs signāluguns (dzeltens) uz katra otrā vadstatņa.

Palīgbarjeras

Palīgbarjera

Norobežojuma barjeras Nr. 910 vai Nr. 911 aprīkotas vismāz ar trīm signālugunīm (dzeltena)

Norobežojuma barjeras Nr. 912 aprīkotas vismāz ar piecam signālugunīm (sarkanas)

PIEZĪMES

1. Ceļa zīmes uzstādīt atbilstoši LVS 77:2014 "Ceļa zīmes" un MK Nr. 421 "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem" prasībām.
2. Aprīkot būvberdres ar norobežojošām barjeram.
3. Nodrošināt iedzīvotāju un operatīvā transporta piekļūšanu slēgta posma objektiem.
4. Darbu veicējs SIA "Ostas celtnieks" ierīko norobežojošās barjeras un tās apkalpo, mainot ceļa darbu vietas robežas, nodrošinot aprīkojuma atbilstošu izvietojumu.
5. SIA "Ostas celtnieks", atbildīgais būvdarbu vadītājs - Tamāra Gubina, tālr. 29257980
6. Shēmas darbības sākums saskaņā ar būvdarbu kalendāro grafiku no 14.07.2015 līdz 31.08.2015
7. Pēc būvdarbu pabeigšanas pagaidu ceļa aprīkojums tiek demontēts.
8. Darbus veikt pa posmiem. Posma garums līdz 50m.
9. Nodrošināt piekļūšanu objektiem slēgtā posma zonā. Pirms darbu uzsākšanas informēt objektu īpašniekus par ielas posma slēgšanas grafiku un braukšanas apgrūtinājumiem.
10. Norobežojuma barjeras Nr. 912 uzstādīt pirms satiksmei slēgtajiem ceļa darbu posmiem.
    Lietot vadstatņus (Nr. 908, 909) vai barjeras (Nr. 910, 911) darbu vietas norobežošanai no brauktuves.
    Izmantot palīgbarjeras vai signāllentes gājēju norobežošanai no darbu zonas.
11. Nodrošināt satiksmes regulētājus maksimumstundā no 8.00-9.30 un no 16.30-18.00.

Saava-LV SIA "Saava-LV", Alises iela 2^a, Rīga LV 1046 Vien.reģ.Nr 40103129768, PVN Nr LV 40103129768 Tālr.: 7312227, 7613303 Fakss: 7311550 Būvkomersanta reģistrācijas Nr 3620-R				Pasūtītājs SIA "Ostas celtnieks"	
				Objekts Jūrmala, Asaru prospekts - Melužu propekts (no Dzimtenes ielas līdz Priežu ielai)	Stadija: TP Marka: GT Lapas Nr: 1
Sastādīja	S. Kazarovecs		07.15	Ceļu satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu uzstādīšanas shēma	Mērogs: 1 : 500
	mob. 26495379				
	e-pasts: sergejs@rl.apollo.lv				
