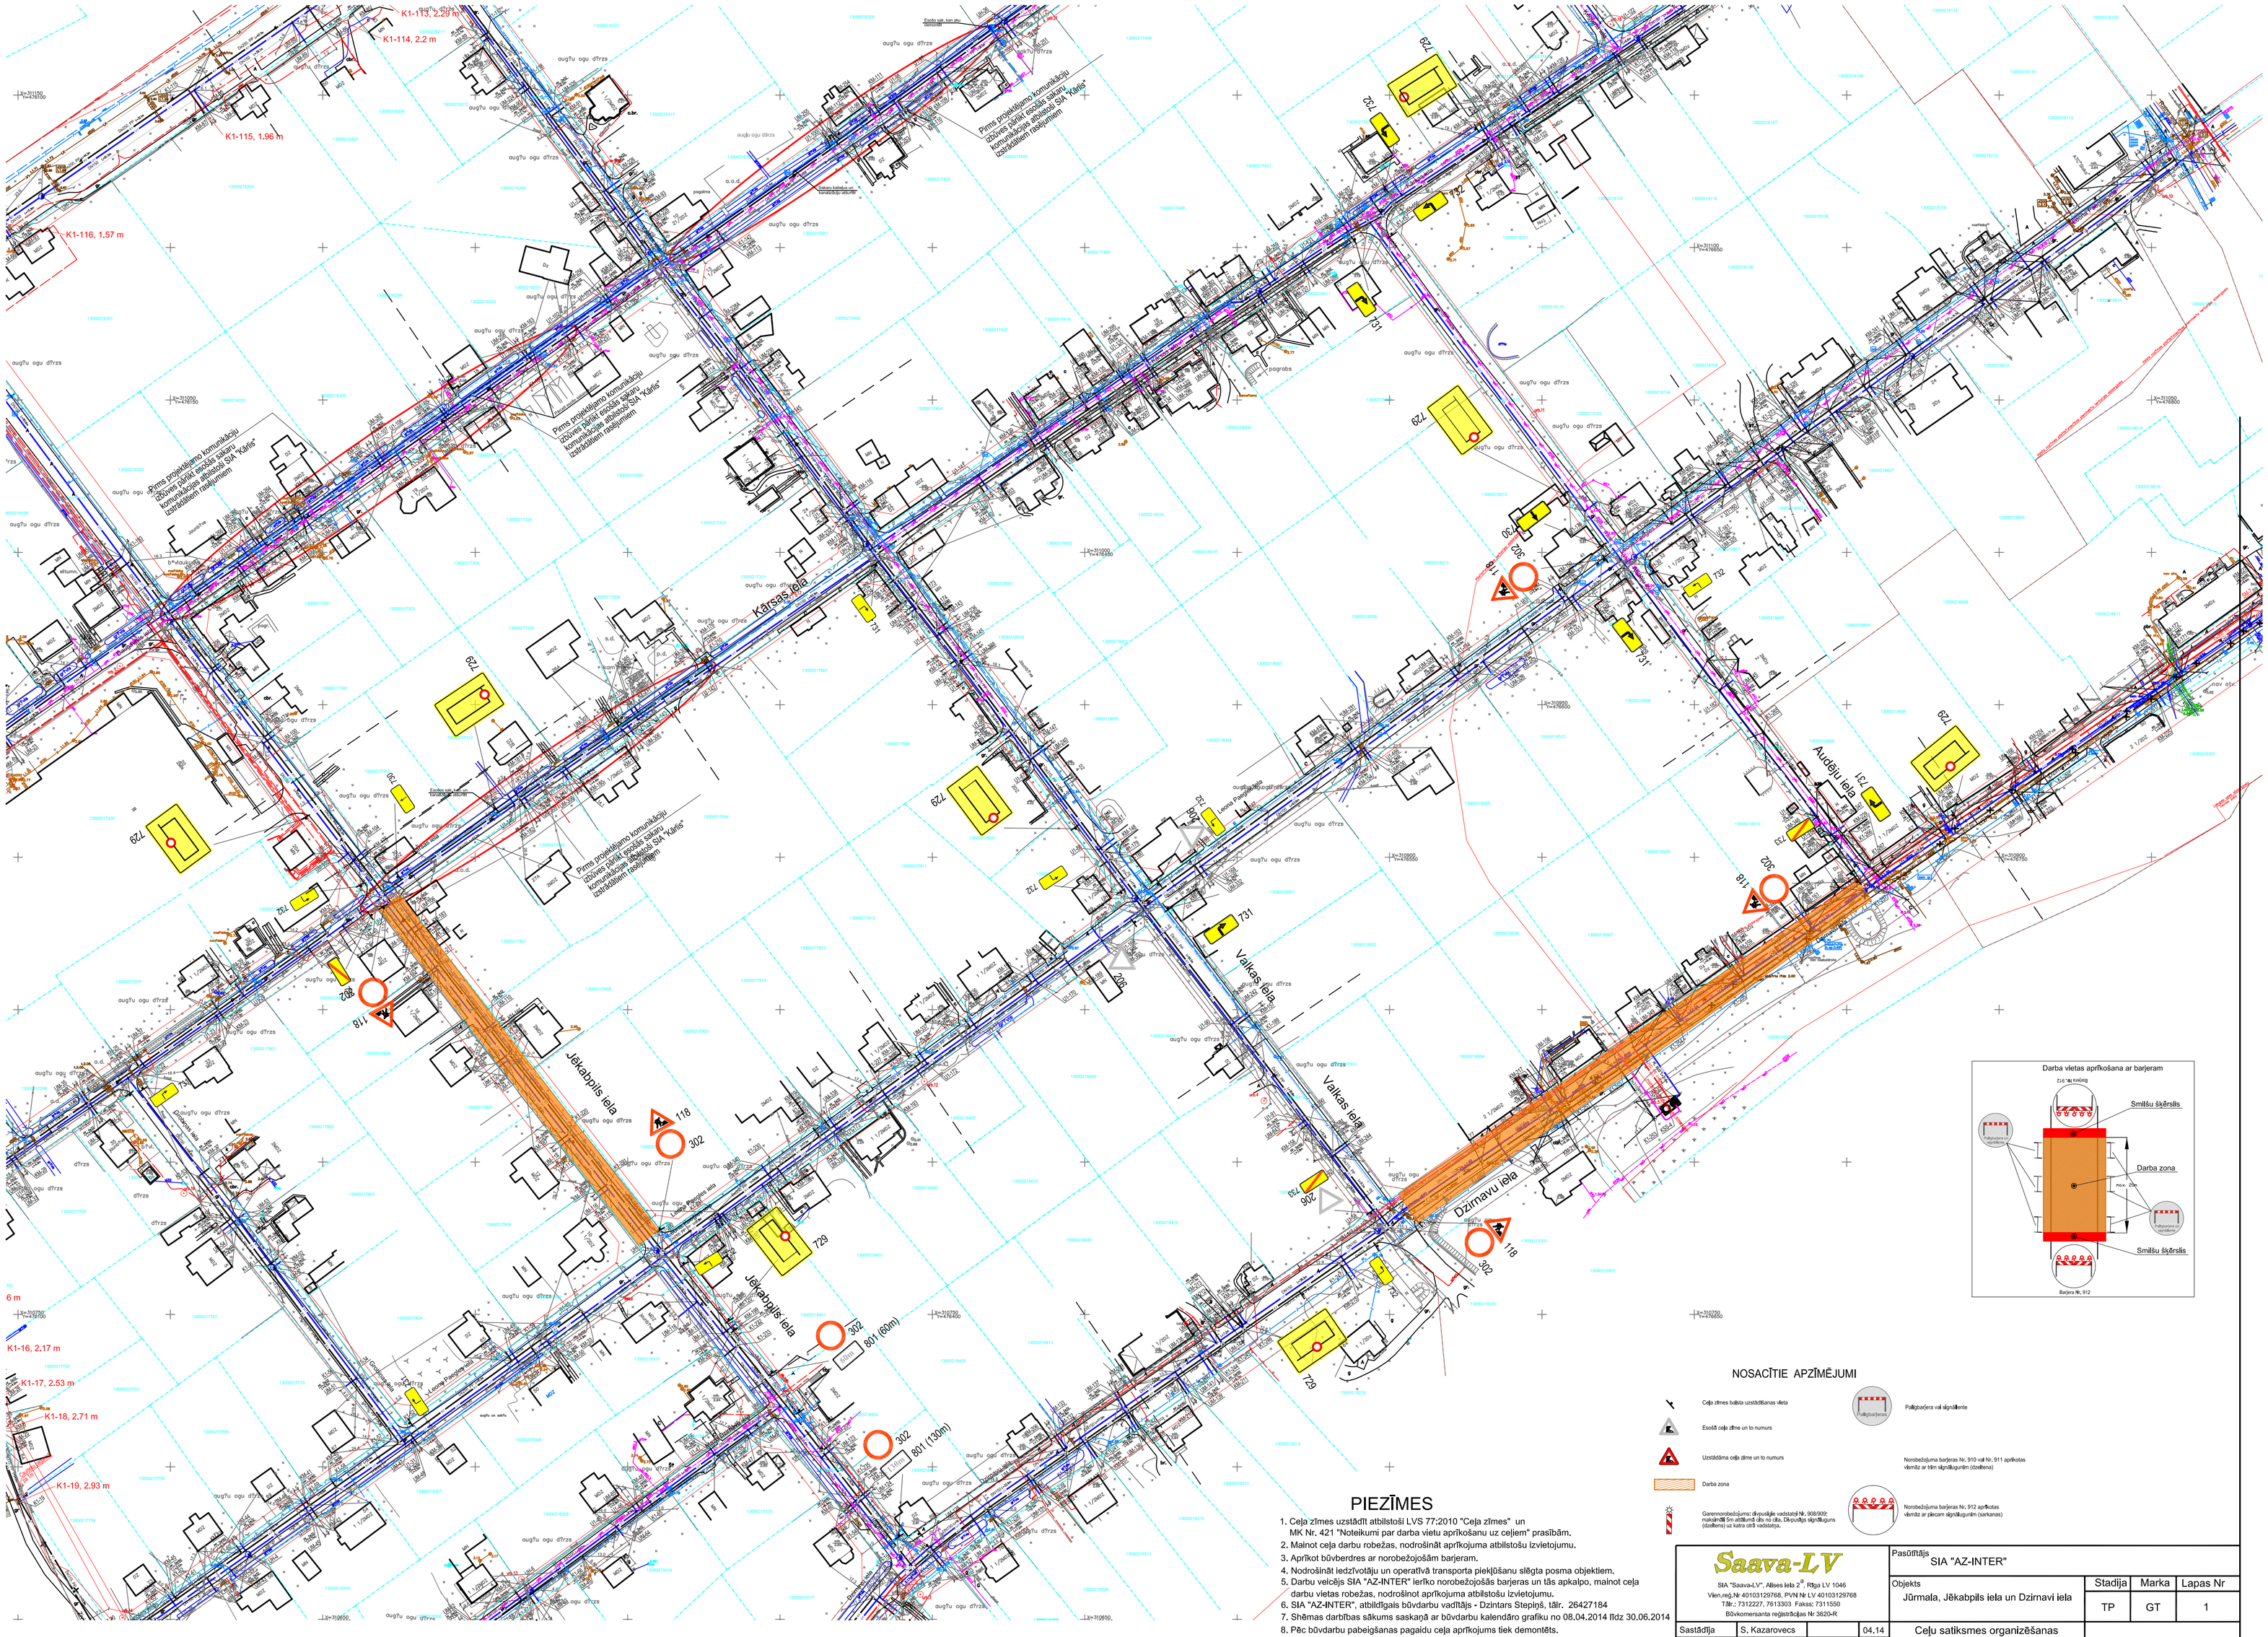
Karsas iela
Jēkabpils iela
Valkas iela
Dzirnavu iela
Ģelģi Ģēģeri
Pārvietojamo barjeru izvietojuma shēma
Darba vietas aprīkošana ar barjeram
Zuā ap malām
Smilšu šķērslis
Darba zona
max. 30m
Smilšu šķērslis
Barjera Nr. 912
NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI
Ceļa zīmes balsta uzstādīšanas vieta
Esošā ceļa zīme un to numurs
Uzstādāmā ceļa zīme un to numurs
Darba zona
Garennoņņebēgums: divpusējās vadstarpē Nr. 908/909: maksimālā šķērsslīpuma daļa no otra. Dīķpusējās slīpnālīgums (dzeltenais) uz katra dīķā vadstarpu.
Pallgbarjera val signālfente
Norobežojuma barjeras Nr. 910 vai Nr. 911 aprīkotas vismāz ar trīm signālugunīm (dzeltena)
Norobežojuma barjeras Nr. 912 aprīkotas vismāz ar pieciem signālugunīm (sarkanas)
PIEZĪMES
1. Ceļa zīmes uzstādīt atbilstoši LVS 77:2010 "Ceļa zīmes" un MK Nr. 421 "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem" prasībām.
2. Mainot ceļa darbu robežas, nodrošināt aprīkojuma atbilstošu izvietojumu.
3. Aprīkot būvbeerdres ar norobežojošām barjeram.
4. Nodrošināt iedzīvotāju un operatīvā transporta piekļūšanu slēgta posma objektiem.
5. Darbu veicējs SIA "AZ-INTER" ierīko norobežojošās barjeras un tās apkalpo, mainot ceļa darbu vietas robežas, nodrošinot aprīkojuma atbilstošu izvietojumu.
6. SIA "AZ-INTER", atbildīgais būvdarbu vadītājs - Dzintars Stepiņš, tālr. 26427184
7. Shēmas darbības sākums saskaņā ar būvdarbu kalendāro grafiku no 08.04.2014 līdz 30.06.2014
8. Pēc būvdarbu pabeigšanas pagaidu ceļa aprīkojums tiek demontēts.
9. Darbus veikt pa posmiem. Posma garums līdz 30m.
10. Gājēju kustības drošībai būvbedri norobežot ar pallgbarjeram val signāllenti.
Saava-LV
SIA "Saava-LV", Alīnes iela 2/3, Rīga LV 1046
Vien.reģ.Nr 40103129768, PVN Nr LV 40103129768
Tālr.: 7312227, 7613303 Fakss: 7311550
Būvkomersanta reģistrācijas Nr 3620-R
Pasūtītājs SIA "AZ-INTER"
Objekts Jūrmala, Jēkabpils iela un Dzirnavi iela
Stadija TP
Marka GT
Lapas Nr 1
Sastādīja S. Kazarovecs 04.14
Ceļu satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu uzstādīšanas shēma
Mērogs: 1:1000
